



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Preventivo dei costi e impegni orari

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>             | 1.1.4                                           |
| <b>Stato</b>                | Approvato                                       |
| <b>Redazione</b>            | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica<sub>G</sub></b> | Matteo Cuogo, Giulia Barzon                     |
| <b>Approvazione</b>         | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b>         | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>                  | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>          | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei cambiamenti

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                                                    |
|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4    | 04/11/2025 | Giulia Barzon   | Revisione finale e approvazione                                                                |
| 1.1.3    | 04/11/2025 | Joseph Grant    | Aggiunta della tabella in sezione 'Impegno Orario' e aggiunta subsezione 'Rotazione dei ruoli' |
| 1.1.2    | 30/10/2025 | Matteo Cuogo    | Prima revisione                                                                                |
| 1.1.1    | 29/10/2025 | Tutto il gruppo | Modifiche finali al documento                                                                  |
| 1.1.0    | 26/10/2025 | Giulia Barzon   | Aggiunta di parte dei contenuti                                                                |
| 1.0.0    | 25/10/2025 | Giulia Barzon   | Stesura iniziale del documento                                                                 |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

## Indice

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Analisi e suddivisione dei ruoli</b> | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Impegno orario</b>                   | <b>2</b> |
| 3.1      | Rotazione dei ruoli . . . . .           | 2        |
| 3.2      | Suddivisione ore per ruolo . . . . .    | 2        |
| <b>4</b> | <b>Analisi dei rischi</b>               | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Scadenza di consegna</b>             | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Preventivo dei costi</b>             | <b>4</b> |

## 1 Introduzione

Il presente documento descrive la pianificazione temporale e la stima dei costi per lo sviluppo del progetto Second Brain proposto dall'azienda Zucchetti. Vengono qui definite le ore di lavoro previste per ruolo, la suddivisione dei ruoli, l'analisi dei rischi e il preventivo dei costi per la realizzazione del progetto.

Questo documento è a completamento della **Lettera di Presentazione** e della **Valutazione dei Capitoli**, disponibili nella repository<sub>G</sub> del gruppo:

<https://github.com/ByteMe25/ByteMe>

## 2 Analisi e suddivisione dei ruoli

In questa sezione vengono descritti i ruoli che ciascun membro del gruppo ricoprirà durante lo sviluppo del progetto. Ogni componente del gruppo dovrà ruotare su tutti i ruoli e assumere ogni ruolo per un tempo totale congruo, anche in base a esigenze e preferenze personali.

| Ruolo          | Responsabilità                                                                                                                                                                             | Costo orario (euro) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Responsabile   | Coordinamento del gruppo, corretta rotazione dei ruoli, pianificazione, gestione delle scadenze, approvazione rilasci. Numero medio di ore leggermente inferiore agli altri ruoli.         | 30                  |
| Amministratore | Gestione strumenti, configurazione ambienti, documentazione, assicura ambiente e infrastruttura robusti e affidabili per sviluppo ed esecuzione.                                           | 20                  |
| Analista       | Analisi dei requisiti <sub>G</sub> , studio di fattibilità, definizione casi d'uso. Figura necessaria principalmente nelle prime fasi dello sviluppo del progetto.                         | 25                  |
| Progettista    | Progettazione architettuale, design del sistema, definizione componenti e risorse necessarie. Numero di ore sufficientemente alto per strutturare in modo corretto e completo il progetto. | 25                  |
| Programmatore  | Sviluppo codice, implementazione funzionalità, ottimizzazione codice, apprendimento tecnologie da usare nel progetto. Numero elevato di ore, distribuite per tutti i membri del team.      | 15                  |
| Verificatore   | Controllo qualità software, testing affidabile, testing automatico, verifica <sub>G</sub> documenti e codice. Ruolo importante nel progetto.                                               | 15                  |

Tabella 2: Descrizione ruoli e costi orari

### 3 Impegno orario

Il gruppo ByteMe si impegna a dedicare al progetto un totale di 558 ore complessive, suddivise equamente tra i 6 membri, ovvero in totale 93 ore per membro. Ciascun componente ricoprirà tutti i ruoli in modo rotazionale per garantire un'esperienza formativa completa.

| Nome             | Ore D'impegno |
|------------------|---------------|
| Joseph Grant     | 93            |
| Tommaso Tombacco | 93            |
| Giulia Barzon    | 93            |
| Chiara Grossele  | 93            |
| Matteo Cuogo     | 93            |
| Elisa Marchioro  | 93            |

Tabella 3: Distribuzione delle 558 ore per membro

#### 3.1 Rotazione dei ruoli

Durante il progetto ogni membro avrà l'opportunità di svolgere ogni ruolo. Abbiamo deciso che la riassegnazione dei ruoli avverrà alla fine di ogni sprint<sub>G</sub>. La durata di questi periodi verrà stabilita successivamente all'assegnazione dell'appalto, in seguito ad un confronto con l'azienda.

#### 3.2 Suddivisione ore per ruolo

Questa distribuzione delle ore nasce da un'analisi precisa delle esigenze del nostro progetto. L'obiettivo è concentrarci sulla qualità tecnica, assegnando più tempo ai ruoli più cruciali per lo sviluppo, la progettazione e la verifica<sub>G</sub>. La stima delle ore per i ruoli di responsabile e amministratore è stata fatta pensando alle mansioni che devono svolgere di settimana in settimana.

| Ruolo          | Ore totali | Percentuale |
|----------------|------------|-------------|
| Responsabile   | 64         | 11,5%       |
| Amministratore | 83         | 14,9%       |
| Analista       | 80         | 14,3%       |
| Progettista    | 85         | 15,2%       |
| Programmatore  | 130        | 23,3%       |
| Verificatore   | 116        | 20,8%       |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b> | <b>100%</b> |

Tabella 4: Suddivisione ore per ruolo

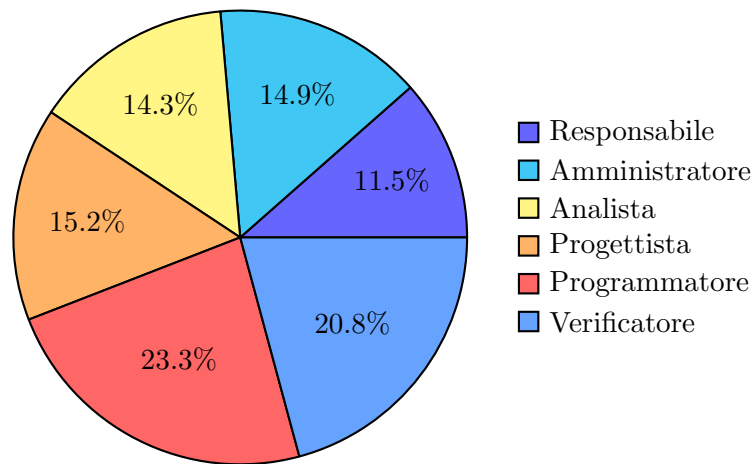


Figura 1: Distribuzione percentuale delle ore per ruolo

## 4 Analisi dei rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto e le contromisure che il team intende adottare per mitigarli.

| Rischio                             | Gravità | Probabilità | Contromisure                                              |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Difficoltà apprendimento tecnologie | Media   | Media       | Studio anticipato, formazione interna, supporto aziendale |
| Impegni personali                   | Bassa   | Media       | Comunicazione anticipata, pianificazione flessibile       |
| Impegni universitari e sessioni     | Bassa   | Alta        | Pianificazione anticipata, distribuzione carico di lavoro |
| Ritardi nello sviluppo              | Alta    | Bassa       | Monitoraggio costante, buona pianificazione               |
| Problemi di comunicazione           | Media   | Bassa       | Riunioni regolari, canali comunicativi definiti           |
| Mancanza di supporto esecutivo      | Media   | Bassa       | Comunicazione anticipata e regolare                       |

Tabella 5: Analisi dei rischi

## 5 Scadenza di consegna

Sulla base dell'impegno orario preventivato e considerando le festività, i possibili rischi e gli impegni universitari, il gruppo si impegna a consegnare il progetto completo entro il **15 Aprile 2026**.

## 6 Preventivo dei costi

| <b>Ruolo</b>   | <b>Ore totali</b> | <b>Costo orario (euro)</b> | <b>Costo totale (euro)</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Responsabile   | 64                | 30                         | 1920                       |
| Amministratore | 83                | 20                         | 1660                       |
| Analista       | 80                | 25                         | 2000                       |
| Progettista    | 85                | 25                         | 2125                       |
| Programmatore  | 130               | 15                         | 1950                       |
| Verificatore   | 116               | 15                         | 1740                       |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b>        |                            | <b>11.395</b>              |

Tabella 6: Preventivo dei costi

Il costo totale preventivato per lo sviluppo del progetto ammonta a **11.395 euro**.
