



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Preventivo dei costi e impegni orari

Versione	1.1.2
Stato	Approvato
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Matteo Cuogo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.1.2	30/10/2025	Matteo Cuogo	Revisione e approvazione finale
1.1.1	29/10/2025	Tutto il gruppo	Modifiche finali al documento
1.1.0	26/10/2025	Giulia Barzon	Aggiunta di parte dei contenuti
1.0.0	25/10/2025	Giulia Barzon	Stesura iniziale del documento

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
2	Analisi e suddivisione dei ruoli	1
3	Impegno orario	2
3.1	Suddivisione ore per ruolo	2
4	Analisi dei rischi	3
5	Scadenza di consegna	3
6	Preventivo dei costi	3

1 Introduzione

Il presente documento descrive la pianificazione temporale e la stima dei costi per lo sviluppo del progetto Second Brain proposto dall'azienda Zucchetti. Vengono qui definite le ore di lavoro previste per ruolo, la suddivisione dei ruoli, l'analisi dei rischi e il preventivo dei costi per la realizzazione del progetto.

Questo documento è a completamento della **Lettera di Presentazione** e della **Valutazione dei Capitoli**, disponibili nella repository del gruppo:

<https://github.com/ByteMe25/ByteMe>

2 Analisi e suddivisione dei ruoli

In questa sezione vengono descritti i ruoli che ciascun membro del gruppo ricoprirà durante lo sviluppo del progetto. Ogni componente del gruppo dovrà ruotare su tutti i ruoli e assumere ogni ruolo per un tempo totale congruo, anche in base a esigenze e preferenze personali.

Ruolo	Responsabilità	Costo orario (euro)
Responsabile	Coordinamento del gruppo, corretta rotazione dei ruoli, pianificazione, gestione delle scadenze, approvazione rilasci. Numero medio di ore leggermente inferiore agli altri ruoli.	30
Amministratore	Gestione strumenti, configurazione ambienti, documentazione, assicura ambiente e infrastruttura robusti e affidabili per sviluppo ed esecuzione.	20
Analista	Analisi dei requisiti, studio di fattibilità, definizione casi d'uso. Figura necessaria principalmente nelle prime fasi dello sviluppo del progetto.	25
Progettista	Progettazione architettuale, design del sistema, definizione componenti e risorse necessarie. Numero di ore sufficientemente alto per strutturare in modo corretto e completo il progetto.	25
Programmatore	Sviluppo codice, implementazione funzionalità, ottimizzazione codice, apprendimento tecnologie da usare nel progetto. Numero elevato di ore, distribuite per tutti i membri del team.	15
Verificatore	Controllo qualità software, testing affidabile, testing automatico, verifica documenti e codice. Ruolo importante nel progetto.	15

Tabella 2: Descrizione ruoli e costi orari

3 Impegno orario

Il gruppo ByteMe si impegna a dedicare al progetto un totale di 558 ore complessive, suddivise equamente tra i 6 membri, ovvero in totale 93 ore per membro. Ciascun componente ricoprirà tutti i ruoli in modo rotazionale per garantire un'esperienza formativa completa.

3.1 Suddivisione ore per ruolo

Questa distribuzione delle ore nasce da un'analisi precisa delle esigenze del nostro progetto. L'obiettivo è concentrarci sulla qualità tecnica, assegnando più tempo ai ruoli più cruciali per lo sviluppo, la progettazione e la verifica.

Ruolo	Ore totali	Percentuale
Responsabile	64	11,5%
Amministratore	83	14,9%
Analista	80	14,3%
Progettista	85	15,2%
Programmatore	130	23,3%
Verificatore	116	20,8%
Totale	558	100%

Tabella 3: Suddivisione ore per ruolo

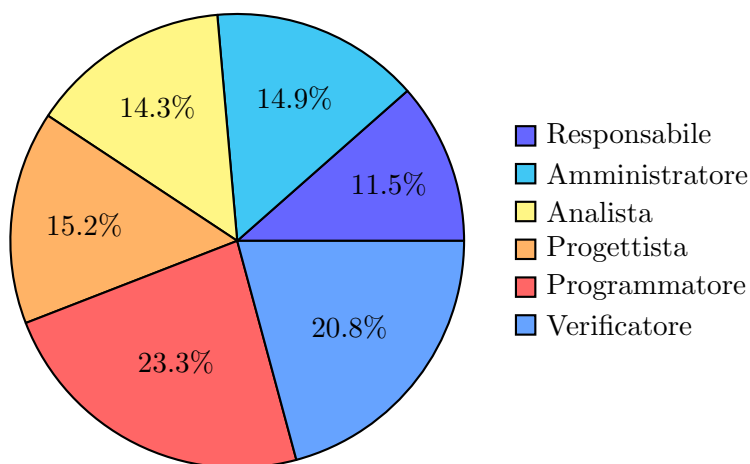


Figura 1: Distribuzione percentuale delle ore per ruolo

4 Analisi dei rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto e le contromisure che il team intende adottare per mitigarli.

Rischio	Gravità	Probabilità	Contromisure
Difficoltà apprendimento tecnologie	Media	Media	Studio anticipato, formazione interna, supporto aziendale
Impegni personali	Bassa	Media	Comunicazione anticipata, pianificazione flessibile
Impegni universitari e sessioni	Bassa	Alta	Pianificazione anticipata, distribuzione carico di lavoro
Ritardi nello sviluppo	Alta	Bassa	Monitoraggio costante, buona pianificazione
Problemi di comunicazione	Media	Bassa	Riunioni regolari, canali comunicativi definiti
Mancanza di supporto esecutivo	Media	Bassa	Comunicazione anticipata e regolare

Tabella 4: Analisi dei rischi

5 Scadenza di consegna

Sulla base dell'impegno orario preventivato e considerando le festività, i possibili rischi e gli impegni universitari, il gruppo si impegna a consegnare il progetto completo entro il **15 Aprile 2026**.

6 Preventivo dei costi

Ruolo	Ore totali	Costo orario (euro)	Costo totale (euro)
Responsabile	64	30	1920
Amministratore	83	20	1660
Analista	80	25	2000
Progettista	85	25	2125
Programmatore	130	15	1950
Verificatore	116	15	1740
Totale	558		11.395

Tabella 5: Preventivo dei costi

Il costo totale preventivato per lo sviluppo del progetto ammonta a **11.395 euro**.
