



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Preventivo dei costi e impegni orari

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 1.1.4                                           |
| <b>Stato</b>        | Approvato                                       |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica</b>     | Matteo Cuogo, Giulia Barzon                     |
| <b>Approvazione</b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei cambiamenti

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                                                    |
|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4    | 04/11/2025 | Giulia Barzon   | Revisione finale e approvazione                                                                |
| 1.1.3    | 04/11/2025 | Joseph Grant    | Aggiunta della tabella in sezione 'Impegno Orario' e aggiunta subsezione 'Rotazione dei ruoli' |
| 1.1.2    | 30/10/2025 | Matteo Cuogo    | Prima revisione                                                                                |
| 1.1.1    | 29/10/2025 | Tutto il gruppo | Modifiche finali al documento                                                                  |
| 1.1.0    | 26/10/2025 | Giulia Barzon   | Aggiunta di parte dei contenuti                                                                |
| 1.0.0    | 25/10/2025 | Giulia Barzon   | Stesura iniziale del documento                                                                 |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

## Indice

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Analisi e suddivisione dei ruoli</b> | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Impegno orario</b>                   | <b>2</b> |
| 3.1      | Rotazione dei ruoli . . . . .           | 2        |
| 3.2      | Suddivisione ore per ruolo . . . . .    | 2        |
| <b>4</b> | <b>Analisi dei rischi</b>               | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Scadenza di consegna</b>             | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Preventivo dei costi</b>             | <b>4</b> |

## 1 Introduzione

Il presente documento descrive la pianificazione temporale e la stima dei costi per lo sviluppo del progetto Second Brain proposto dall'azienda Zucchetti. Vengono qui definite le ore di lavoro previste per ruolo, la suddivisione dei ruoli, l'analisi dei rischi e il preventivo dei costi per la realizzazione del progetto.

Questo documento è a completamento della **Lettera di Presentazione** e della **Valutazione dei Capitoli**, disponibili nella repository del gruppo:

<https://github.com/ByteMe25/ByteMe>

## 2 Analisi e suddivisione dei ruoli

In questa sezione vengono descritti i ruoli che ciascun membro del gruppo ricoprirà durante lo sviluppo del progetto. Ogni componente del gruppo dovrà ruotare su tutti i ruoli e assumere ogni ruolo per un tempo totale congruo, anche in base a esigenze e preferenze personali.

| Ruolo          | Responsabilità                                                                                                                                                                             | Costo orario (euro) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Responsabile   | Coordinamento del gruppo, corretta rotazione dei ruoli, pianificazione, gestione delle scadenze, approvazione rilasci. Numero medio di ore leggermente inferiore agli altri ruoli.         | 30                  |
| Amministratore | Gestione strumenti, configurazione ambienti, documentazione, assicura ambiente e infrastruttura robusti e affidabili per sviluppo ed esecuzione.                                           | 20                  |
| Analista       | Analisi dei requisiti, studio di fattibilità, definizione casi d'uso. Figura necessaria principalmente nelle prime fasi dello sviluppo del progetto.                                       | 25                  |
| Progettista    | Progettazione architettuale, design del sistema, definizione componenti e risorse necessarie. Numero di ore sufficientemente alto per strutturare in modo corretto e completo il progetto. | 25                  |
| Programmatore  | Sviluppo codice, implementazione funzionalità, ottimizzazione codice, apprendimento tecnologie da usare nel progetto. Numero elevato di ore, distribuite per tutti i membri del team.      | 15                  |
| Verificatore   | Controllo qualità software, testing affidabile, testing automatico, verifica documenti e codice. Ruolo importante nel progetto.                                                            | 15                  |

Tabella 2: Descrizione ruoli e costi orari

### 3 Impegno orario

Il gruppo ByteMe si impegna a dedicare al progetto un totale di 558 ore complessive, suddivise equamente tra i 6 membri, ovvero in totale 93 ore per membro. Ciascun componente ricoprirà tutti i ruoli in modo rotazionale per garantire un'esperienza formativa completa.

| Nome             | Ore D'impegno |
|------------------|---------------|
| Joseph Grant     | 93            |
| Tommaso Tombacco | 93            |
| Giulia Barzon    | 93            |
| Chiara Grossele  | 93            |
| Matteo Cuogo     | 93            |
| Elisa Marchioro  | 93            |

Tabella 3: Distribuzione delle 558 ore per membro

#### 3.1 Rotazione dei ruoli

Durante il progetto ogni membro avrà l'opportunità di svolgere ogni ruolo. Abbiamo deciso che la riassegnazione dei ruoli avverrà alla fine di ogni sprint. La durata di questi periodi verrà stabilita successivamente all'assegnazione dell'appalto, in seguito ad un confronto con l'azienda.

#### 3.2 Suddivisione ore per ruolo

Questa distribuzione delle ore nasce da un'analisi precisa delle esigenze del nostro progetto. L'obiettivo è concentrarci sulla qualità tecnica, assegnando più tempo ai ruoli più cruciali per lo sviluppo, la progettazione e la verifica. La stima delle ore per i ruoli di responsabile e amministratore è stata fatta pensando alle mansioni che devono svolgere di settimana in settimana.

| Ruolo          | Ore totali | Percentuale |
|----------------|------------|-------------|
| Responsabile   | 64         | 11,5%       |
| Amministratore | 83         | 14,9%       |
| Analista       | 80         | 14,3%       |
| Progettista    | 85         | 15,2%       |
| Programmatore  | 130        | 23,3%       |
| Verificatore   | 116        | 20,8%       |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b> | <b>100%</b> |

Tabella 4: Suddivisione ore per ruolo

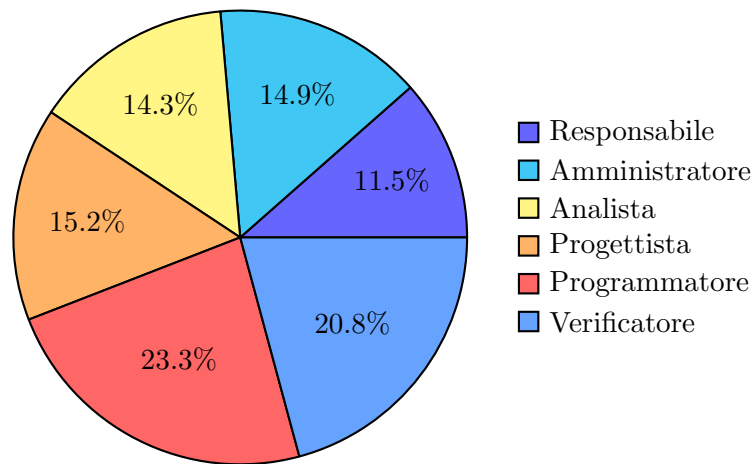


Figura 1: Distribuzione percentuale delle ore per ruolo

## 4 Analisi dei rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto e le contromisure che il team intende adottare per mitigarli.

| Rischio                             | Gravità | Probabilità | Contromisure                                              |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Difficoltà apprendimento tecnologie | Media   | Media       | Studio anticipato, formazione interna, supporto aziendale |
| Impegni personali                   | Bassa   | Media       | Comunicazione anticipata, pianificazione flessibile       |
| Impegni universitari e sessioni     | Bassa   | Alta        | Pianificazione anticipata, distribuzione carico di lavoro |
| Ritardi nello sviluppo              | Alta    | Bassa       | Monitoraggio costante, buona pianificazione               |
| Problemi di comunicazione           | Media   | Bassa       | Riunioni regolari, canali comunicativi definiti           |
| Mancanza di supporto esecutivo      | Media   | Bassa       | Comunicazione anticipata e regolare                       |

Tabella 5: Analisi dei rischi

## 5 Scadenza di consegna

Sulla base dell'impegno orario preventivato e considerando le festività, i possibili rischi e gli impegni universitari, il gruppo si impegna a consegnare il progetto completo entro il **15 Aprile 2026**.

## 6 Preventivo dei costi

| Ruolo          | Ore totali | Costo orario (euro) | Costo totale (euro) |
|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| Responsabile   | 64         | 30                  | 1920                |
| Amministratore | 83         | 20                  | 1660                |
| Analista       | 80         | 25                  | 2000                |
| Progettista    | 85         | 25                  | 2125                |
| Programmatore  | 130        | 15                  | 1950                |
| Verificatore   | 116        | 15                  | 1740                |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b> |                     | <b>11.395</b>       |

Tabella 6: Preventivo dei costi

Il costo totale preventivato per lo sviluppo del progetto ammonta a **11.395 euro**.
